


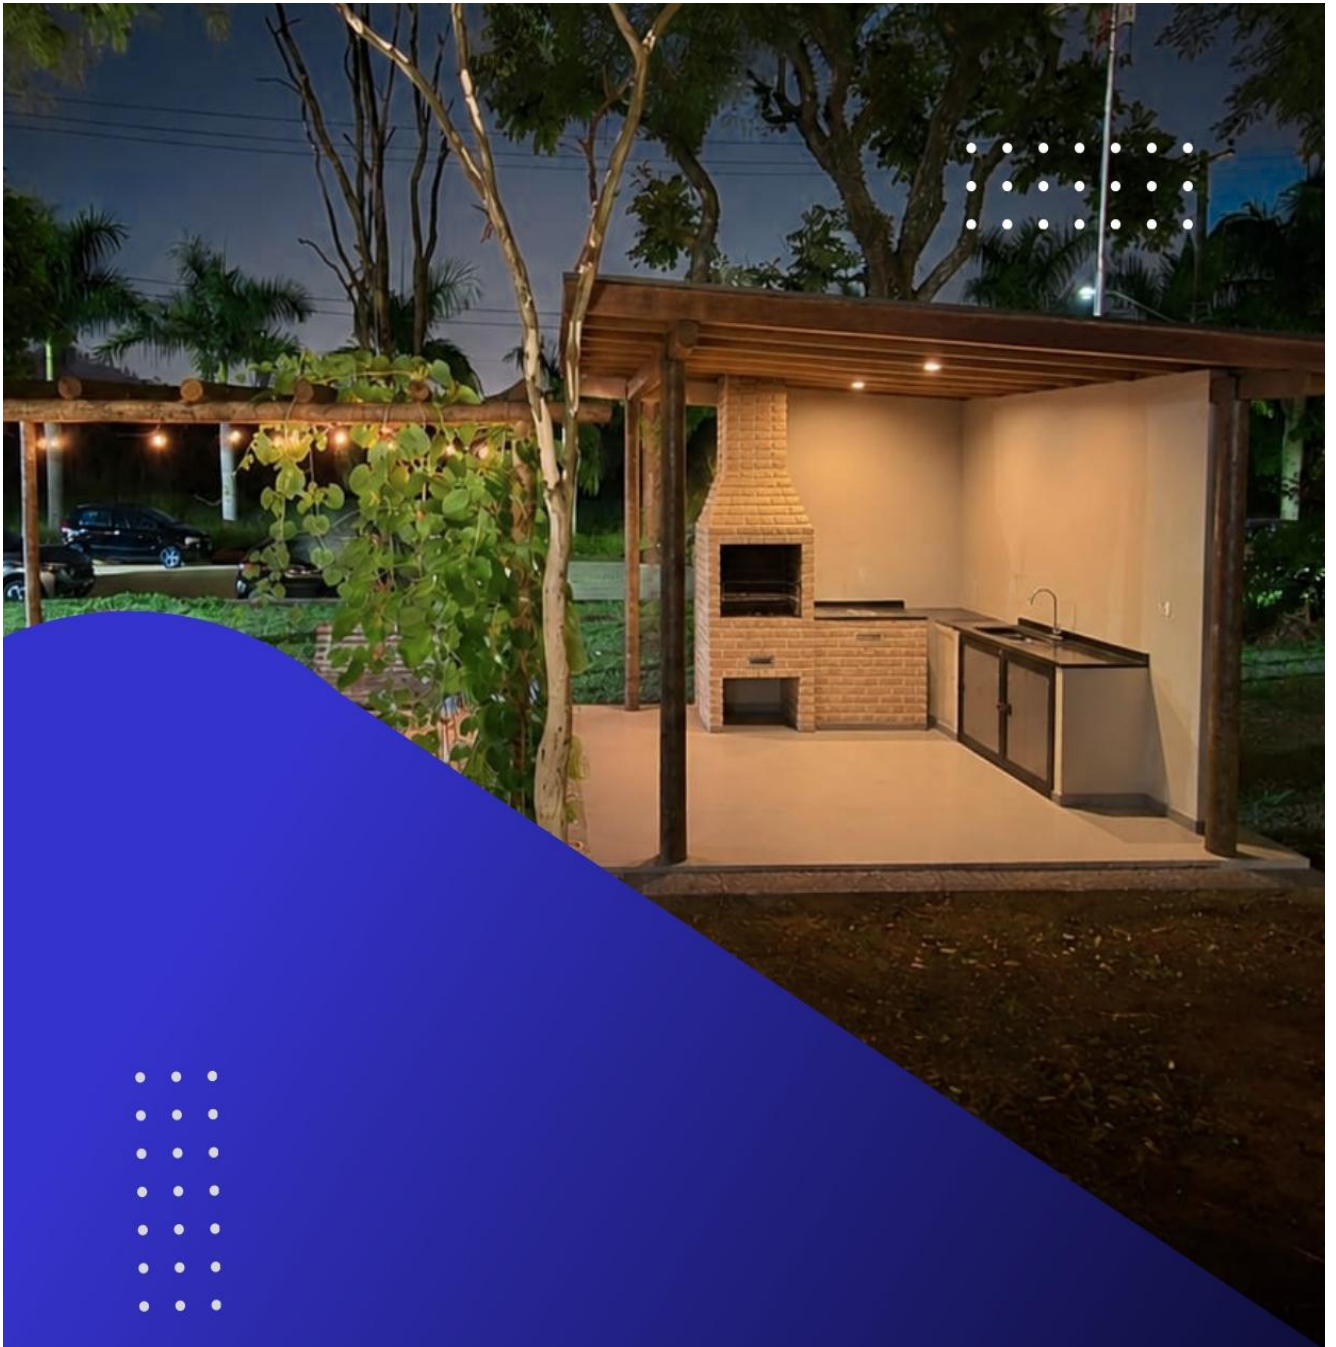

RELATÓRIO DE TCC

DIÁRIO DE OBRA

Edificação

DIÁRIO DE OBRA - RELATÓRIO DE TCC

Sumário

1º Mês de Evolução da Obra. Agosto de 2026	3
Dia do Cronograma:	4
Dia 1	4
Dia do Cronograma:	8
Dia 2	8
Dia do Cronograma:	11
Dia 3	11
Dia do Cronograma:	14
Dia 4	14
Dia do Cronograma:	17
Dia 5	17
Dia do Cronograma:	21
Dia 6	21
Dia do Cronograma:	25
Dia 7	25
Dia do Cronograma:	29
Dia 8	29
2º Mês de Evolução da Obra. Setembro de 2026.	33
Dia do Cronograma:	34
Dia 9	34
ALUNOS DO TCC e suas Responsabilidades.	44



EVOLUÇÃO DA OBRA

1º MÊS

1º Mês de Evolução da Obra. Agosto de 2026

Esta parte do relatório, engloba todos os registros diários do primeiro mês.

DIÁRIO DE OBRA - RELATÓRIO DE TCC

INFORMAÇÕES GERAIS

Dia do Cronograma:	Dia 1
Data:	04/08/2026
Condições Climáticas:	Noite : Tempo firme com aumento de nuvens, sem previsão de chuvas.
Temperatura Média:	Entre 14° C a 16° C
Responsável Técnico:	Prof. Marcus (orientador)
Responsável Técnico no Canteiro de Obra:	Alunos: Lucas / Thiago Matheus / Walmir
Responsável Técnico em Segurança do Trabalho	Aluna: Jenifer
Responsável Técnico do Projeto Arquitetônico	Aluna: Andressa
Mão de Obra presente:	Alunos: Andressa, Cesar, Hadassa, Ivaneide, Jacira, Jenifer, Laura, Lucas, Nathan, Pedrito, Sônia, Thiago Matheus, Thiago Nicolas e Walmir.
Responsável Técnico deste Relatório / Fotos	Aluna: Ana Cristina (relatório) Alunas: Jenifer e Hadassa (fotos/videos)

MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Efetivo / Função	Equipamentos / Ferramentas
Pedreiros: Lucas, Thiago Matheus, Pedrito e Walmir	Trena, linha de nylon
Pedreiros/Ajudantes: Cesar, Nathan e Thiago Nicolas	Enxada, Cavadeira, Chibanca
Técnico em Segurança do Trabalho: Jenifer	Fita Zebrada e Cartaz
Ajudantes Geral: Todos os presentes no dia	
Equipamentos utilizado conforme controle do almoxarifado, aluno responsável Walmir. (foto anexa)	Enxada, Cavadeira e Chibanca

DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Hoje foi realizado o início do Projeto de melhoria da área de lazer e construção da Churrasqueira. Após reunião técnica com o Profº Orientador Marcus e os idealizadores do projeto da churrasqueira juntamente com a responsável técnica do projeto arquitetônico aluna Andressa, definiram o local exato para a construção.

Com isso foi realizada a locação de obra, conforme a ABNT NBR 17058, fazendo a raspagem e limpeza manual do terreno, onde foi removido a vegetação, detritos, raízes e obstáculos na área exata e no entorno. O objetivo foi obter uma superfície plana, limpa e regular para evitar distorções nas medições e garantir a aderência do gabarito.

Nossa responsável técnica em segurança do Trabalho, a aluna Jenifer, com a colaboração das alunas Ivaneide e Sonia, fizeram a mobilização e isolamento da área, passando fita zebrada e fixando sinalização de alertas visuais através de cartazes de advertência em pontos estratégicos e de fácil leitura, como preconiza as NR-18 que garante acesso seguro e a NR-26 que define a fita zebrada (amarela e preta) e cartazes indicando riscos foi também utilizada a NR-01 que sustenta a aplicação das medidas preventivas da coletividade.

Hoje mais cedo, houve uma logística de transporte de insumos que foram doados pela empresa apoiadora (Arbait Engenharia Ltda), através das alunas Jenifer e Hadassa, sendo que as mesmas se encarregaram de fazer a logística do transporte através de veículo terceirizado contratado por demanda para trazer telhas até o nosso canteiro de obra.

O descarregamento dos insumos no canteiro de obra, foi exigindo planejamento logístico e atendimento estrito às normas de ergonomia e segurança de acordo com a NR-18 (condições de segurança e Saúde no Trabalho) e a NR-17 (ergonomia).

Todos os insumos excedentes junto com as ferramentas e maquinário utilizados hoje, foram devidamente recolhidos para o almoxarifado técnico de acordo com os critérios de organização especial previsto pela ABNT NBR 12284.

Ficando assim o canteiro de obra dentro dos requisitos de ordem e segurança previstos no item 18.12 da NR 18 do Ministério do Trabalho.

OCORRÊNCIAS, DESVIOS OU ATRASOS

Não houve ocorrências, tudo saiu conforme planejado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO (RELAÇÃO E LEGENDAS)

Código da Foto

Foto nº 1



Legenda Descritiva Técnica

Foto nº 1, observa-se o local que será realizado o Projeto da Construção da Churrasqueira na Instituição de Ensino ETECVAV. Hoje esta área está sem qualquer intervenção, mas logo nascerá nosso grande projeto para que alunos e/ou professores se confraternizem.

Foto nº 2



Foto nº 2, temos o registro do local em seu estado original, totalmente preservado, com sua vegetação e estruturas ainda intocadas.

Foto nº 3



À esquerda na foto nº 3, temos o registro da reunião técnica com o Profº Orientador Marcus e os idealizadores do projeto da churrasqueira juntamente com a responsável técnica do projeto arquitetônico aluna Andressa, definindo o local exato para a construção, e fazendo os últimos acertos para o início da obra.

Foto nº 4



Foto nº 4, demonstra o exato momento em que a equipe de trabalho esta executando a raspagem e limpeza manual no terreno, onde foi removido a vegetação, detritos, raízes e obstáculos na área exata e no entorno, com o objetivo de obter uma superficie plana, limpa e regular.

Foto nº 5



Foto nº 5, observa-se o local já cercado com fita zebra e placas indicativa, como preconiza as NR-18 que garante acesso seguro e a NR-26 que define a fita zebra (amarela e preta) e cartazes indicando riscos.

Foto nº 6



Foto nº 6 Demonstra vista geral da frente de trabalho, durante o período noturno e em horario de aula de TCC sob a orientação do Professor Marus Tripe em reunião operacional de campo. Destacando os serviços de limpeza mecanica e manual com regularização do terreno.

Foto nº 7




Ja na foto de nº 7, demonstra a raspagem e limpeza manual feita no terreno, onde foi removido a vegetação, detritos, raízes e obstáculos na área exata e no entorno.

Foto nº 7



Foto nº 8

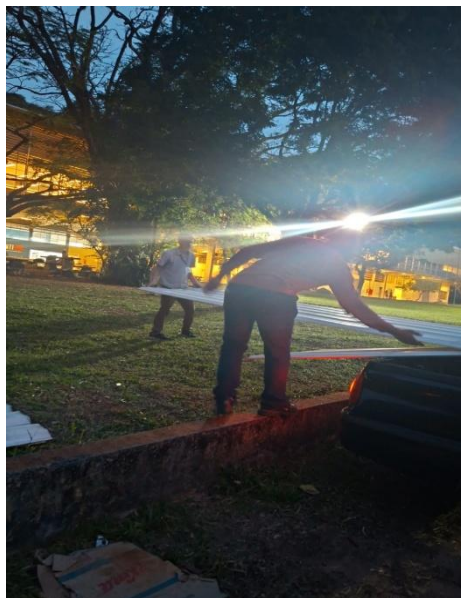

Processo de movimentação de insumos, registram através das fotos 7 e 8

Telhas que foram retirados da empresa Arbait Engenharia Ltda e transportado para a área (canteiro de obra) do trabalho acadêmico TCC na escola ETECVAV.

Foto nº 7 no local da retirada.

Foto nº 8 no loca da entrega.

Foto nº 9

Escola Técnica Vasco Antonio Venciarutti Laboratório de Construção Civil									
Turma: 3L		Professores Resp.: M. B. S.		Aluno Resp.: W. M. S.		Data: 01/03/26			
Quantidade:		Material:		Devolução:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X									
X									
X									
Chimenea									
Enxada									
Cavadeira									

Na foto ao lado , temos o controle do Almojarifado , na qual o aluno Walmir esta se responsabilizando em fazer o registro de retirada / devolução de todos os equipamentos e ferramentas de uso coletivo usado no dia de hoje para a execução da obra, onde todas ferramentas foram devolvidas em perfeito estado

DIÁRIO DE OBRA - RELATÓRIO DE TCC

INFORMAÇÕES GERAIS

Dia do Cronograma:	Dia 2
Data:	07/08/2026
Condições Climáticas:	Noite : Tempo instável com muitas nuvens, ventos fortes e chuva.
Temperatura Média:	Entre 16° C a 17° C
Responsável Técnico:	Não houve.
Responsável Técnico no Canteiro de Obra:	Não houve obra, apenas transporte material
Mão de Obra presente:	Alunos: Ana Cristina, Cesar, Ivaneide, Jacira, Laura, Lucas, Nathan, Pedrito, Sonia, Thiago Matheus, Thiago Nicolas e Walmir
Responsável Técnico deste Relatório / Fotos	Aluna: Ana Cristina (relatório/fotos/videos)

MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Efetivo / Função	Equipamentos / Ferramentas
Mestre de obra/ condutor do carrinho plataforma: Lucas	Carrinho Plataforma sem grades
Transporte no local da Obra: Todos os presentes no dia.	Carregamento, Descarregamento e Armazenamento manual dos insumos da obra.

DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Neste dia, foi realizado o transporte dos blocos e lajes do local onde estavam armazenadas, até o canteiro de obra, exigindo planejamento logístico e atendimento estrito às normas de ergonomia e segurança de acordo com a NR-18 (condições de segurança e Saúde no Trabalho) e a NR-17 (ergonomia). Os blocos cerâmicos 14x29x39, empilhados no carrinho de plataforma sem grades, foram arrumados de forma firme para impedir quedas ou trepidações excessivas para não causar danos no trajeto até a área do descarregamento dos insumos no canteiro de obra.

Ao chegarem ao seu destino, além da contagem e conferência quantitativa, foram realizados rigorosos procedimentos de inspeção de qualidade, identificação e proteção física dos mesmos, sendo esses procedimentos normatizados pela ABNT NBR 15270 (componentes cerâmicos para alvenaria) e pelas diretrizes gerais de logística e segurança.

OCORRÊNCIAS, DESVIOS OU ATRASOS

Não houve ocorrências, tudo saiu conforme planejado, apesar de não ter sido o dia para realizar esse trabalho, aproveitamos uma aula vaga para adiantar o projeto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO (RELAÇÃO E LEGENDAS)

Código da Foto nº 10 e 11



Legenda Descritiva Técnica

Fotos 10 e 11, mostram o Processo de movimentação de insumos (Blocos Cerâmicos 14x29x39, que estavam armazenados no pátio do estabelecimento de ensino ETECVAV.

Código da Foto nº 12 e 13



As fotos 12 e 13, registram o momento onde o grupo esta retirando os insumos do patio de material de estocagem.

Os blocos foram empilhados no carrinho de plataforma sem grades, e arrumados de forma firme para impedir quedas ou trepidações excessivas.

Código da Foto nº 14 e 15



Nestas fotos 14 e 15 registram a chegada dos blocos cerâmicos no canteiro de obra.

Onde foi feita conferência quantitativa, e realizados rigorosos procedimentos de inspeção de qualidade, identificação.

Código da Foto nº 16 e 17



Registro da equipe realizando o transporte manual de materiais/insumos necessários à execução dos serviços da churrasqueira, devendo ser mantidas condições adequadas de organização, circulação, utilização de EPI e segurança durante a movimentação.

Código da Foto nº 18 e 19



Neste processo de movimentação que esta representado nas fotos 18 e 19 o grupo unido consegue fazer o transporte dos blocos cerâmicos e das placas cimentícias para agilizar a proxima etapa da obra, área de trabalho academico TCC na escola ETECVAV.

DIÁRIO DE OBRA - RELATÓRIO DE TCC

INFORMAÇÕES GERAIS

Dia do Cronograma:	Dia 3
Data:	11/08/2026
Condições Climáticas:	Noite : Tempo frio com muita nebulosidade, sem chuva.
Temperatura Media:	Entre 12° C a 17° C
Responsável Técnico:	Profº. Marcus (orientador)
Responsável Técnico no Canteiro de Obra:	Alunos: Lucas / Walmir
Mão de Obra presente:	Alunos: Ana, Andressa, Cesar, Emerson, Hadassa, Ivaneide, Jacira, Jenifer, Laura, Lucas, Nathan, Pedrito, Thiago Nicolas e Walmir.
Responsável Técnico deste Relatório / Fotos	Aluna: Ana (relatorio) Aluna: Hadassa (fotos/videos)

MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Efetivo / Função	Equipamentos / Ferramentas
Pedreiro: Lucas, responsável pelos cortes de ajuste das placas cimentícia	Esmerilhadeira Angular (lixadeira)(Lucas)
No local da Obra: Todos os presentes no dia	Foram utilizadas todas os equipamento e ferramentas em forma revezamento
Equipamentos utilizado conforme controle do almoxarifado, aluna responsável Ivaneide. (foto anexa)	Enxada, Pá, Desempenadeira, Colher de pedreiro, Prumo e Carrinho de mão

DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Os serviços executados de hoje foram: Realizar a preparação do terreno e início da escavação manual para implantação da fundação da churrasqueira, conforme locação prevista para a estrutura. Foi realizada a movimentação e remoção do solo superficial utilizando ferramenta manual. A área de trabalho permanece delimitada e sinalizada.

A continuidade da escavação e execução da fundação deverá observar as dimensões e cotas estabelecidas em projeto, bem como as condições reais do solo verificadas durante a execução.

Deverão ser mantidas as medidas de segurança previstas na NR-18, incluindo controle das bordas da escavação, prevenção contra desmoronamento e verificação de interferências subterrâneas.

Quanto a segurança, a atividade condicionada ao uso dos EPIs previstos no PGR e à manutenção do isolamento da área. Ferramentas e materiais permanecem organizados, sem obstrução das áreas de circulação, conforme Normas regulamentares NR-06 (EPI), NR-11 Movimentação e manuseio de materiais aplicável, NR 17 Ergonomia e condições de trabalho e NR-18 Segurança e saúde na indústria da Construção.

O serviço esta em andamento, aguardando instruções técnicas para a execução da etapa subsequente.

OCORRÊNCIAS, DESVIOS OU ATRASOS

Tudo transcorreu de forma normal, sem nenhuma intercorrência.

REGISTRO FOTOGRÁFICO (RELAÇÃO E LEGENDAS)	
Foto nº 20 e 21 	Legenda Descritiva Técnica Registro fotográfico 20 e 21, observa-se a execução de serviço de preparação do terreno e escavação manual do solo, utilizando ferramenta manual, para implantação da estrutura de apoio da churrasqueira.
Foto nº 22 	Neste registro, é seguro afirmar que há escavação/preparação do solo, sendo que a fundação já foi dimensionada, e que atingiu determinada profundidade.
Foto nº 23 e 24 	Observa-se a atuação da equipe de trabalho utilizando ferramentas manuais. Como enxadas, pás e ferramentas de corte/regularização do solo, realizando o espalhamento e ajuste do material terroso. Ja na foto 24, pode ser verificado o acompanhamento técnico e fiscalização em campo feito pelas alunas, Hadassa e Ana Cristina.

Foto n° 25 e 26



Legenda Descritiva Tecnica

Na imagem de nº 25, podemos ver o aluno Lucas utilizando a ferramenta elétrica (serra mármore), executando um corte preciso em uma placa cimentícia, na área de apoio logístico.

Na imagem de nº 26 a equipe está terminando a movimentação de terra e também podemos observar que o perímetro encontra-se devidamente isolado.

Foto n° 27



Legenda Descritiva Tecnica

Na foto ao lado , temos o controle do Almoarifado , na qual a aluna Ivaneide esta se responsabilizando em fazer o registro de retirada / devolução de todos os equipamentos e ferramentas de uso coletivo usado no dia de hoje para a execução da obra, onde todos os “OK” significa que todo o material retornou 100% intacto.

DIÁRIO DE OBRA - RELATÓRIO DE TCC

INFORMAÇÕES GERAIS

Dia do Cronograma:	Dia 4
Data:	12/08/2026
Condições Climáticas:	Noite : Tempo firme mas frio com muita nuvens, mas sem previsão de chuva.
Temperatura Media:	Entre 12° C a 13° C
Responsável Técnico:	Profª. Risoneide (orientadora)
Responsável Técnico no Canteiro de Obra:	Alunos: Lucas / Walmir
Mão de Obra presente:	Alunos: Ana, Andressa, Cesar, Emerson, Hadassa, Ivaneide, Jacira, Jenifer, Laura, Lucas, Nathan, Pedrito, Thiago Nicolas e Walmir.
Responsável Técnico deste Relatório / Fotos	Aluna: Ana (relatorio) Aluna: Hadassa (fotos/videos)

MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Efetivo / Função	Equipamentos / Ferramentas
Pedreiro: Lucas, responsável pelos cortes de ajuste das placas cimentícia	Esmerilhadeira Angular (lixadeira)(Lucas)
Local da Obra: Todos os presentes no dia	Todos envolvidos com as tarefas e reveesando as ferramentas.
Equipamentos utilizado conforme controle do almoxarifado, aluna responsável Hadassa. (foto anexa)	Enxada, Marreta, Soquete, Vanga, Enxadinha, Pá, Picareta e Carrinho de mão

DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

As atividades executadas hoje foram a realização dos serviços preliminares de marcação e esquadro da área projetada para a instalação da churrasqueira. Houve a execução de escavação manual do solo para a abertura das valas de fundação, com posterior regularização e compactação manual do fundo da vala. Houve também o nivelamento do terreno para a colocação das placas cimentícias que servirão de guia e contenção perimetral, para conter o aterro e servir de forma para a concretagem do radier. A área de trabalho permanece delimitada e sinalizada.

A continuidade da escavação e execução da fundação deverá observar as dimensões e cotas estabelecidas em projeto, bem como as condições reais do solo verificadas durante a execução.

O serviço esta em andamento, aguardando instruções técnicas através da análise de projeto impresso para acompanhamento e alinhamento da execução dos trabalhos na etapa subsequente.

OCORRÊNCIAS, DESVIOS OU ATRASOS

Tudo transcorreu de forma normal, sem nenhuma intercorrência.

REGISTRO FOTOGRÁFICO (RELAÇÃO E LEGENDAS)

Foto nº 28 e 29

Legenda Descritiva Técnica



Registro fotográfico 28 e 29, observa-se o acompanhamento técnico e inspeção visual durante os trabalhos de escavação manual e regularização do solo para a infraestrutura da churrasqueira.

Foto nº 30



Foto nº 30, percebemos que esta sendo executado os serviços de escavação manual profunda e remoção de terra para a preparação da base/fundação da área da churrasqueira.

Foto nº 31 e 32

Legenda Descritiva Técnica



Observa-se na foto 31, a aluna Hadassa no interior do almoxarifado técnico de canteiro de obra, onde esta realizando conferência de componentes para execução da alvenaria. Já na foto 32, detalhamos as estantes de armazenamento de insumos e ferramentas manuais.


Foto n° 33 e 34



Legenda Descritiva Tecnica

Nas imagens 33 e 34, registra a atividade de bancada na central de armação dentro do canteiro técnico. As alunas Andressa e Jacira, realizam o processo manual de dobragem de estribos e barras de aço, utilizando ferramentas manuais específicas (como chaves de dobra e pinos de fixação na bancada). O procedimento visa moldar o aço conforme as especificações do projeto estrutural para posterior montagem na área de execução.

Foto n° 35

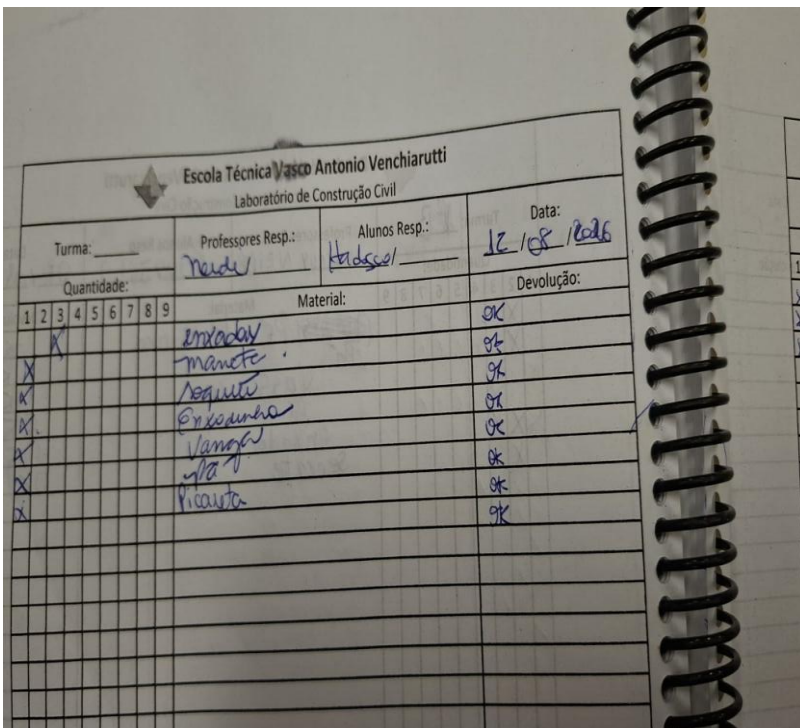

Legenda Descritiva Tecnica

Na foto ao lado de nº 35 , temos o controle do Almoxarifado , na qual a aluna Hadassa esta se responsabilizando em fazer o registro de retirada / devolução de todos os equipamentos e ferramentas de uso coletivo usado no dia de hoje para a execução da obra, onde todos os “OK” significa que todo o material retornou 100% intacto.

DIÁRIO DE OBRA - RELATÓRIO DE TCC

INFORMAÇÕES GERAIS

Dia do Cronograma:	Dia 5
Data:	18/08/2026
Condições Climáticas:	Noite : Tempo firme com céu limpo e estabilidade atmosférica, sem previsão de chuvas.
Temperatura Média:	Entre 18° C a 20° C
Responsável Técnico:	Não houve
Responsável Técnico no Canteiro de Obra:	Alunos: Lucas / Thiago Matheus / Walmir
Responsável Técnico em Segurança do Trabalho	Aluna: Jenifer
Mão de Obra presente:	Alunos: Hadassa, Jacira, Jenifer, Lucas, Nathan, Pedrito, Sônia Thiago Matheus e Walmir.
Responsável Técnico deste Relatório / Fotos	Aluna: Ana Cristina (relatório) Alunas: Jenifer e Hadassa (fotos/videos)

MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Efetivo / Função	Equipamentos / Ferramentas
Pedreiros: Lucas, Thiago Matheus, e Walmir	Nível a laser e carretinha tipo reboque (Lucas)
Pedreiro/ Eletricista: Pedrito	Enxada, Cavadeira.
Ajudantes Geral: Todos os presentes no dia	Picareta, Pá, Socador e Carrinho de mão, sendo revezado entre os integrantes do grupo no dia.
Equipamentos utilizado conforme controle do almoxarifado, aluno responsável Walmir. (foto anexa)	Enxada, Cavadeira, Picareta, Pá, Socador e Carrinho de mão.

DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Hoje o presente relatório tem por finalidade registrar tecnicamente os serviços executados durante o período noturno na área destinada à implantação da churrasqueira da ETECVAV, contemplando as atividades de preparação da base para execução do radier, movimentação de materiais, preparação e regularização do solo e lançamento das infraestruturas elétricas e hidráulicas.

A execução ocorreu em período em que a unidade escolar se encontrava fechada aos demais alunos, permitindo que a equipe trabalhasse com a área de intervenção delimitada e sem a circulação habitual de estudantes.

A atividade contou com a participação efetiva de 09 integrantes da equipe, entre eles sendo 04 mulheres, que participaram diretamente das atividades práticas de obra, demonstrando comprometimento, cooperação e disposição para a execução dos serviços necessários à evolução física do projeto.

Os trabalhos se iniciaram no transporte manual dos agregados através de uma carretinha (reboque) cedida pelo aluno Lucas, que facilitou o transporte da área do armazenamento até a área de preparação, sendo organizados de forma a facilitar a posterior dosagem e mistura do concreto.

Essa movimentação de material, levando em consideração o peso e distância de transporte esta estabelecido na NR-18 relacionada à movimentação, transporte armazenamento e manuseio de materiais no canteiro de obra, já a postura e condições ergonômicas dos alunos envolvidos, estão estabelecidos na NR-17 que trata dos aspectos ergonômicos das atividades em consonância com as medidas previstas no gerenciamento de riscos da obra.

Neste mesmo dia, também foram executados serviços de aterro, distribuição e apiloamento manual do solo, visando proporcionar uma superfície regular e adequadamente preparada para a sequência construtiva do radier, que deverá ser executado conforme projeto estrutural e projeto de fundações, respeitando as

dimensões, espessuras, armaduras, cobrimentos, resistência característica do concreto e demais especificações estabelecidas pelos responsáveis técnicos presente na obra.

Para o dimensionamento e execução das fundações, esta sendo aplicado, sistema da ABNT NBR 6122 – de projeto e execução de fundações e da ABNT 6118 – para elementos de concreto estrutural.

Foi também executado o lançamento e posicionamento dos conduítes destinados às instalações elétricas da futura área da churrasqueira, de acordo com o traçado previsto para a infraestrutura e tendo sido executada de acordo com NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade e a ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.

Também neste mesmo, dia foi realizado o lançamento dos conduítes/tubulações destinados à infraestrutura hidráulica da área da churrasqueira, deixando previstas as passagens necessárias para os pontos de utilização tendo sido executada de acordo com a ABNT NBR 5626 – Sistemas prediais de água fria e água quente – Projeto, execução, operação e manutenção.

A execução ocorreu de forma compatibilizada com o projeto arquitetônico, hidráulico e estrutural, evitando interferências posteriores na estrutura do radier, porque qualquer erro de posicionamento ou esquecimento exigirá quebra de concreto gerando retrabalho, desperdício de material e atraso na obra.

Após o término dos trabalhos, todas as ferramentas e maquinários foram recolhidos ao almoxarifado técnico de acordo com o que esta previsto pela ABNT NBR 12284 que estabelece critérios mínimos de organização para a vivência em canteiros de obras, garantindo higiene, conforto e segurança aos trabalhadores.

OCORRÊNCIAS, DESVIOS OU ATRASOS

Apesar de ser um dia atípico onde a unidade escolar se encontrava fechada aos demais alunos, com a área de intervenção delimitada e sem a circulação habitual de estudantes e estando também com um número reduzido de alunos participantes na obra, não houve ocorrências e tudo saiu conforme planejado.

Registro de reconhecimento da equipe:

A participação feminina deve ser registrada não apenas como quantitativo, mas como efetiva participação na execução dos serviços, demonstrando que as atividades de construção civil foram desenvolvidas de maneira colaborativa e sem distinção de gênero quanto à capacidade de contribuir para a execução das tarefas.

Embora parte dos demais integrantes do grupo tenha estado ausente, a equipe presente manteve a execução das atividades programadas, permitindo o avanço da preparação da infraestrutura da churrasqueira.

REGISTRO FOTOGRÁFICO (RELAÇÃO E LEGENDAS)

Código da Foto	Legenda Descritiva Técnica
Foto nº 36 e nº 37	
	Nas fotos nº 36 e 37, observa-se o local onde os trabalhos se iniciaram que foi no transporte manual dos agregados através de uma carretinha (reboque) cedida pelo aluno Lucas, que facilitou o transporte da área do armazenamento até a área de preparação (canteiro de obra).

Foto nº 38 – A e 38 - B

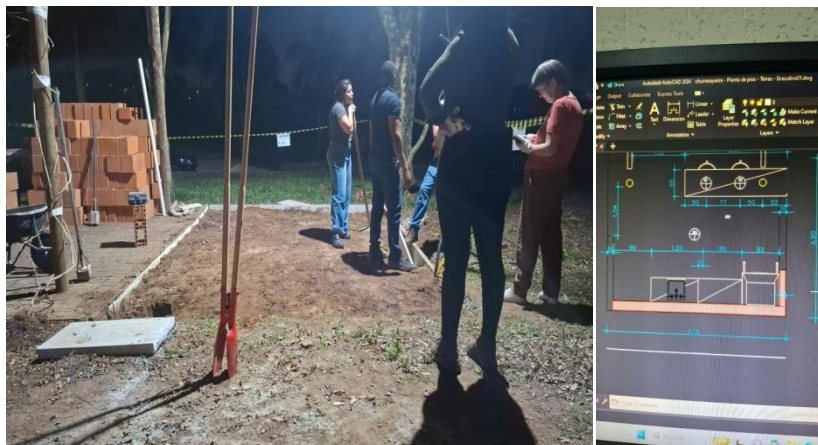


Foto nº 38-A , temos o registro dos integrantes do grupo em reunião fazendo a verificação in loco da execução das tarefas, para que ocorra de forma compatibilizada com o projeto arquitetônico, hidráulico e estrutural, evitando interferências posteriores na estrutura do radier.

Foto nº 38-B, o projeto Elétrico e Hidráulico.

Foto nº 39



À esquerda na foto nº 39 temos o registro onde destaca a execução de trabalho de movimentação de terra, já em fase de nivelamento e limpeza, para aguardar a próxima etapa.

Foto nº 40



Foto nº 40, demonstra o exato momento em que a equipe de trabalho esta executando os serviços de infraestrutura elétrica externa, fazendo o assentamento de tubulações para passagem de cabeamento de energia.

Foto nº 41- A e 41 - B



Foto nº 41 - A e 41 - B, observa-se em destaque, as passagens de tubulações onde estão sendo assentados eletrodutos flexíveis e tubulações rígidas.

Foto nº 42 e foto nº 43



Foto nº 42, esta demonstrando a execução de infraestrutura e regularização do terreno para a implantação da área de convivio com churrasqueira.

Na foto 43, observa-se o detalhe da passagem de tubulação em ponto rebaixado, demarcando o alinhamento da linhas de instalações hidrossanitárias.

Foto nº 43

Escola Técnica Vasco Antonio Venchiarutti Laboratório de Construção Civil									
Turma: 30L		Professores Resp.: Marcos		Alunos Resp.: Walmir		Data: 18/08/2026		Devolução:	
Quantidade:		Material:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
X	X								SOCCOPO
X									PICARETA
X	X	X							PA
X									CHURRASQUEIRA
X	X	X							ENCHIAVA
X									CAVADURA

Na foto ao lado de nº 43 , temos o controle do Almoxarifado , na qual o aluno Walmir esta se responsabilizando em fazer o registro de retirada / devolução de todos os equipamentos e ferramentas de uso coletivo usado no dia de hoje para a execução da obra, onde todos os "OK" significa que todo o material retornou 100% intacto e em perfeito estado.

DIÁRIO DE OBRA - RELATÓRIO DE TCC

INFORMAÇÕES GERAIS

Dia do Cronograma:	Dia 6
Data:	19/08/2026
Condições Climáticas:	Noite : Tempo firme com céu limpo, umidade do ar extremamente baixa, sem previsão de chuvas.
Temperatura Média:	Entre 17° C a 20° C
Responsável Técnico:	Não houve
Responsável Técnico no Canteiro de Obra:	Alunos: Lucas / Thiago Matheus / Walmir
Mão de Obra presente:	Alunos: Ivaneide, Jacira, Lucas, Pedrito, Thiago Matheus e Walmir.
Responsável Técnico deste Relatório / Fotos	Aluna: Ana Cristina (relatório) Alunos: Lucas e Walmir (fotos/videos)

MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Efetivo / Função	Equipamentos / Ferramentas
Pedreiros: Lucas, Thiago Matheus, Pedrito e Walmir	Nível a laser (Lucas).
Pedreiros/Ajudantes: Cesar, Nathan e Thiago Nicolas	Enxada, Cavadeira, Chibanca
Técnico em Segurança do Trabalho: Jenifer	Fita Zebrada e Cartaz
Ajudantes Geral: Todos os presentes no dia	
Equipamentos utilizado conforme controle do almoxarifado, aluna responsável Ivaneide. (foto anexa)	Enxada, Picareta, Pá, Cavadeira, Chibanca colher de pedreiro, regua, latas e carrinho de mão.

DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Hoje estamos dando continuidade nas atividades de preparação da base para execução do radier, movimentação de materiais, preparação e regularização do solo e lançamento das infraestruturas elétricas e hidráulicas, iniciadas ontem.

Mais uma vez a execução ocorreu em período em que a unidade escolar se encontrava fechada aos demais alunos, permitindo que a equipe trabalhasse com a área de intervenção delimitada e sem a circulação habitual de estudantes.

A atividade contou com a participação efetiva de apenas 06 integrantes da equipe, entre eles sendo 02 mulheres, que participaram diretamente das atividades práticas de obra, demonstrando comprometimento, cooperação e disposição para a execução dos serviços necessários à evolução física do projeto.

A movimentação da areia e da pedra britada nº 01 (agregados), realizada durante o dia anterior teve como finalidade de facilitar a preparação da execução do concreto do radier, neste dia.

Antes da concretagem, houve a conferência das dimensões do radier, as cotas e níveis, espessura prevista, posicionamento das armaduras, posicionamento das instalações embutidas, passagem dos conduítes elétricos, passagem das tubulações hidráulicas, traço e/ou especificação do concreto e de qual forma iria ser feita o lançamento do concreto.

Na Concretagem do Radier, foram feitas 5 massadas, sendo que cada massada foi utilizada:

- 2,5 Carrinho de Areia Lavada,
- 1,5 Carrinho de Pedra Britada nº 01,
- 1 Saco de cimento.

Sabemos que para o concreto, devem ser consideradas as normas técnicas aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 12655 – Concreto de cimento Portland – Preparo, controle, recebimento e aceitação, e a ABNT NBR

14931 – Execução de estruturas de concreto.

O concreto foi distribuído sobre a área previamente preparada, realizando-se o lançamento de maneira progressiva e uniforme, evitando-se concentração excessiva de material em pontos isolados.

Após o lançamento do concreto, foi realizado o espalhamento e nivelamento da superfície, buscando obter uma base uniforme e compatível com a cota estabelecida para a obra.

O acabamento deverá respeitar as tolerâncias previstas em projeto e as condições necessárias para a etapa posterior de execução da churrasqueira.

Após a concretagem, deverá ser realizada a cura do concreto, de modo a reduzir a perda prematura de água e favorecer o desenvolvimento adequado das propriedades do material.

A execução ocorreu de forma compatibilizada com o projeto arquitetônico, hidráulico e estrutural, evitando interferências posteriores na estrutura do radier.

Após o término dos trabalhos, todas as ferramentas e maquinários foram recolhidos ao almoxarifado técnico de acordo com o que está previsto pela ABNT NBR 12284 que estabelece critérios mínimos de organização para a vivência em canteiros de obras, garantindo higiene, conforto e segurança aos trabalhadores.

OCORRÊNCIAS, DESVIOS OU ATRASOS

Apesar de ser mais um dia atípico onde a unidade escolar ainda se encontra fechada aos demais alunos, quero deixar aqui mais um

Registro de reconhecimento da equipe:

Destacando o comprometimento dos 06 integrantes presentes nesta etapa da obra, com especial reconhecimento às 02 mulheres alunas Jacira e Ivaneide, que participaram diretamente das atividades de campo, contribuindo efetivamente para a concretagem do radier.

A atuação demonstra a importância do trabalho colaborativo e da participação de todos os integrantes nas atividades práticas da construção civil, independentemente de gênero, fortalecendo o caráter educativo, profissional e coletivo do projeto desenvolvido na ETECVAV.

Não houve intercorrências e tudo saiu como planejado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO (RELAÇÃO E LEGENDAS)

Código da Foto	Legenda Descritiva Técnica
Foto nº 44 	Foto nº 44, observa-se o local que está sendo concretado, havendo a preparação do concreto que será lançado sobre a tela de armadura metálica

Foto nº 45



Foto nº 45, temos o registro da aplicação do concreto virado em obra e lançado sobre a malha de aço que foi posicionada sobre camada de lastro de brita.

Foto nº 46



À esquerda na foto nº 46 temos o lançamento e espalhamento do concreto transportado em carrinho de mão, até o local da concretagem do radier.

O Volume concretado foi de 96 m³ aproximadamente.

Foto nº 47



Foto nº 47, demonstra o exato momento da conclusão da concretagem da base estrutural da área da churrasqueira. Podem ser vistas a superfície regularizada conforme projeto, com tubos de espera para as instalações hidráulicas e elétricas.

Foto n° 48




Foto nº 48, A equipe técnica que acompanhou o processo e realizou a execução registrando o local após a conclusão da etapa de concretagem do elemento estrutural (Radier).

Foto n° 49 e 50



Foto n° 49

Equipe de trabalho, após conclusão da concretagem, devolvendo no almoxarifado as ferramentas utilizadas, já devidamente lavadas e prontas para serem acondicionadas em seu local de origem.

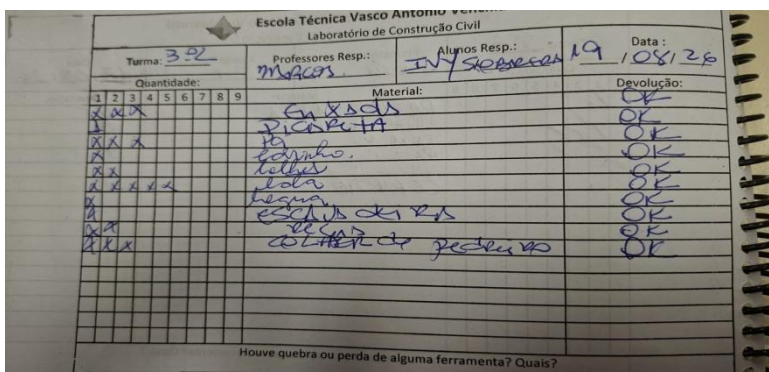

Na foto ao lado de nº 50 , temos o controle do Almoxarifado , na qual a aluna Ivaneide esta se responsabilizando em fazer o registro de retirada / devolução de todos os equipamentos e ferramentas de uso coletivo usado no dia de hoje para a execução da obra, onde todos os “OK” significa que todo o material retornou 100% intacto.

DIÁRIO DE OBRA - RELATÓRIO DE TCC

INFORMAÇÕES GERAIS

Dia do Cronograma:	Dia 7
Data:	25/08/2026
Condições Climáticas:	Noite : Tempo com muitas nuvens, chegando a ter alguns chuviscos
Temperatura Media:	Entre 15° C a 17° C
Responsável Técnico:	Profº. Marcus (orientador)
Responsável Técnico no Canteiro de Obra:	Alunos: Thiago Matheus / Walmir / Lucas
Mão de Obra presente:	Alunos: Ana, Andressa, Cesar, Emerson, Hadassa, Ivaneide, Jacira, Jenifer, Laura, Lucas, Nathan, Pedrito, Thiago Matheus, Thiago Nicolas e Walmir
Responsável Técnico deste Relatório / Fotos	Aluna: Ana (relatorio/fotos/videos) Aluna: Hadassa (fotos/videos)

MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Efetivo / Função	Equipamentos / Ferramentas
Pedreiro: Lucas, responsável pelos cortes de ajuste de nível	Esmerilhadeira Angular (lixadeira)(Lucas)
Motorista: Ana Ajudantes de Transporte: Andressa, Cesar e Thiago M.	Caminhonete (Ana)
Transporte no local da Obra: Todos os presentes no dia	Descarregamento e Armazenamento manual.
Equipamentos utilizado conforme controle do almoxarifado, aluna responsável Ivaneide. (foto anexa)	Enxada, Pá, Desempenadeira, Colher de pedreiro, Prumo e Carrinho de mão

DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

A atividade exercida hoje foi a Locação, Medição de Nível para início da fiada e Logística de transporte de insumos que foram doado pela empresa apoiadora (Construtora Santa Angela), através do aluno Thiago Matheus.

Uma equipe composta por (Ana, Andressa, Thiago M. e Cesar) se deslocou até o fornecedor externo para a retirada do lote de revestimento cerâmico.

Outra equipe (Lucas, Walmir, entre outros presentes) permaneceram no local para efetuar a inspeção visual do (RN) referência de nível geométrica do projeto para a locação da primeira fiada (arranque), no entanto foi verificado um certo desnível o qual fez com que houvesse um corte de ajuste. Este procedimento foi realizado pelo Lucas utilizando uma esmerilhadeira angular, com todos os equipamentos de segurança necessários.

O descarregamento dos insumos no canteiro de obra foi exigindo planejamento logístico e atendimento estrito às normas de ergonomia e segurança de acordo com a NR-18 (condições de segurança e Saúde no Trabalho) e a NR-17 (ergonomia).

Os (insumos) revestimento piso e parede e tubos de PVC para água fria (maron), foram empilhados e armazenados no proprio canteiro de obra.

OCORRÊNCIAS, DESVIOS OU ATRASOS

Atraso por conta do corte de ajuste da primeira fiada (arranque), realizado pelo Lucas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO (RELAÇÃO E LEGENDAS)

Código da Foto nº 51 e 52



Legenda Descritiva Técnica

Processo de movimentação de insumos (Pisos e revestimentos e tubos de PVC para água fria marrom que foram retirados do canteiro de obra da Construtora Santa Angela no alto da Av. Samuel e transportado para a área de trabalho acadêmico TCC na escola ETECVAV.

Foto nº 51 no local da retirada.

Foto nº 52 no local da entrega.

Foto nº 53



Foto nº 54



Legenda Descritiva Técnica

À esquerda foto nº 53 processo de descarga e estocagem com detalhe do local do armazenamento.

Já na foto nº 54, **o Orientador técnico, Profº Marcus Trippe** realiza a revisão detalhada das especificações do projeto junto à redatora a aluna Ana Cristina, responsável pela elaboração do relatório do Diário de Obra do TCC.

Foto nº 55



Na foto 55, esta sendo executado o desbaste de blocos para regularização da primeira fiada.

Esta sendo realizada pelo Lucas um dos integrantes do grupo responsável técnico do canteiro de obra.

Código da Foto nº 56



Legenda Descritiva Técnica

Foto 56 Observa-se que existe um isolamento da área conforme a NR-18 (Segurança e Saúde no Trabalho), combinada com as diretrizes de gerenciamento de poeiras e agentes químicos da NR-15 e de sinalização da NR-26, que foi idealizado e estruturado pela integrante do grupo Jenifer. Fazendo com que consigamos suprir as exigências legais de controlar riscos ocupacionais. PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) na obra.

Código da Foto nº 57



Legenda Descritiva Técnica

Foto 57, Equipe Técnica presente neste dia.

Código da Foto nº 58

Escola Técnica Vasco Antonio Venchiarutti											
Laboratório de Construção Civil											
Turma: 3º L			Professores Resp.: MARGES / JURY			Aluno Resp.: IVY / SOUSA			Data: 15/08/2026		
Quantidade:			Material:			Devolução:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
X									BARRA		
X									FA		
X	X								DESEMPENADEIRA		
X	X								COLAS DE PEDREIRO		
X	X								FURNO		
X									CORTA-RETO		

DIÁRIO DE OBRA - RELATÓRIO DE TCC

INFORMAÇÕES GERAIS

Dia do Cronograma:	Dia 8
Data:	26/08/2026
Condições Climáticas:	Noite : Tempo com muitas nuvens, chegando a ter alguns chuveiros
Temperatura Média:	Entre 16° C a 18° C
Responsável Técnico:	Profª Risoneide (orientadora)
Responsável Técnico no Canteiro de Obra:	Alunos: Thiago Matheus / Walmir / Lucas
Mão de Obra presente:	Alunos: Ana, Andressa, Hadassa, Ivaneide, Jacira, Jenifer, Laura, Lucas, Pedrito Thiago Matheus, Thiago Nicolas e Walmir.
Responsável Técnico deste Relatório / Fotos	Aluna: Ana (relatorio/fotos/videos) Aluna: Hadassa (fotos/videos)

MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Efetivo / Função	Equipamentos / Ferramentas
Pedreiro: Lucas, responsável pela ancoragem do vergalhão de espera.	Perfuratriz (furadeira)(Lucas)
Pedreiros/Ajudantes: Thiago Matheus, Pedrito, Walmir, Jenifer	Colher de pedreiro, Linha.
Ajudantes Geral: Todos os presentes no dia	Transportando Blocos e argamassa.
Equipamentos utilizado conforme controle do almoxarifado, aluno responsável Walmir. (foto anexa)	Enxada, Pá, Lata, Colher de pedreiro, Prumo, Nível de bolha, Linha de Nylon, Meia Cana, Vassoura, Pregos, Martelo, Peneira e Carrinho de mão

DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Após a correta cura e liberação da fundação do tipo radier, hoje a equipe iniciou a etapa de elevação da alvenaria de vedação no local onde será construída a churrasqueira.

O local foi limpo por uma das integrantes da equipe, aluna Jenifer, para que o local do assentamento estivesse isento de poeira, óleo ou graxa.

Após vencida a etapa do nivelamento, foi feita a marcação dos eixos para elevação da alvenaria de vedação pelos responsáveis técnico da obra (Thiago Matheus, Walmir e Lucas) com a supervisão da responsável pelo projeto arquitetônico (Andressa) e é claro com a colaboração dos demais participantes disponíveis neste dia, para ajudar no posicionamento exato das paredes utilizando linha de nylon (linha de pedreiro) presa aos 4 cantos das extremidades. Essa linha serve como guia constante para garantir o alinhamento horizontal (nível) e longitudinal de cada fiada que estará sendo erguida. Sendo exigida a cada fiada o Prumo de face e o nível de bolha para garantir a prumosidade vertical, obedecendo assim o que rege a ABNT NBR 8545, na qual fala sobre o controle do prumo, nível e alinhamento das fiadas para evitar patologias futuras.

Na etapa de execução, os alunos Pedrito e Walmir prepararam a argamassa com a seguinte quantidade:

- 3 latas de areia média lavada peneirada,
- ½ lata de cal hidratada,
- ¾ de lata de cimento tipo CPII,
- 1 ½ lata de água que foi sendo adicionada aos poucos até atingir a consistência pastosa e homogênea (trabalhável).

Respeitando assim, os requisitos de aderência, consistência e retenção de água para a argamassa de assentamento misturada em canteiro que preconiza a ABNT NBR 13281.

Neste dia foram assentados 42 blocos de 14x29x39.

Ajudaram também na organização do canteiro os alunos Thiago Nicolas, Jenifer, Hadassa, Jacira, Laura e Ivaneide, dispondo os blocos cerâmicos ao longo do perímetro, para otimizar o fluxo de trabalho para assentamento dos blocos.

Nesta etapa de hoje, os serviços de alvenaria foram concluídos em conformidade com as diretrizes de execução das normas ABNT NBR 16868 / ABNT NBR 8548.

Após o término do assentamento dos blocos, foi realizada a destinação correta dos resíduos (conforme ABNT NBR 100004) e executada a limpeza seca e pesada do local por todos os participantes presentes no dia de hoje.

Todos os insumos excedentes, ferramentas e maquinário foram devidamente recolhidos para o almoxarifado técnico de acordo com os critérios de organização especial previsto pela ABNT NBR 12284.

Ficando assim o canteiro de obra dentro dos requisitos de ordem e segurança previstos no item 18.12 da NR 18 do Ministério do Trabalho.

OCORRÊNCIAS, DESVIOS OU ATRASOS

Não houve ocorrências, tudo saiu conforme planejado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO (RELAÇÃO E LEGENDAS)

Código da Foto nº 59



Legenda Descritiva Técnica

À esquerda foto nº 59 temos o registro dos preparativos para as marcações dos eixos e posicionar as linhas de nylon para alinhar a primeira fiada de bloco cerâmico.

Código da Foto nº 60



Na foto ao lado observa-se os preparativos da argamassa a limpeza do local de assentamento

Foto nº 61



Foto nº 62



Na foto 61:

Nesta foto, ressaltamos a atividade de marcação e assentamento da primeira fiada de blocos cerâmico estruturais com as medidas 11,5x19x29.

Ja na foto 62 esta sendo executado a perfuração do solo para a fixação/ancoragem do vergalhão de espera.

Esta sendo realizada pelo aluno Lucas, um dos integrantes do grupo responsável técnico do canteiro de obra.


Código da Foto nº 63



Nesta foto de nº 63, os alunos Pedrito, Wlamir estão preparando a argamassa com a seguinte quantidade:

- 3 latas de areia média lavada peneirada, - $\frac{1}{2}$ lata de cal hidratada,
- $\frac{3}{4}$ de lata de cimento tipo CP II,
- 1 $\frac{1}{2}$ lata de água que foi sendo adicionada aos poucos até atingir a consistência pastosa e homogênea (trabalhável).

Respeitando os requisitos de aderência, consistência e retenção de água para a argamassa de assentamento misturada em canteiro que preconiza a ABNT NBR 13281.

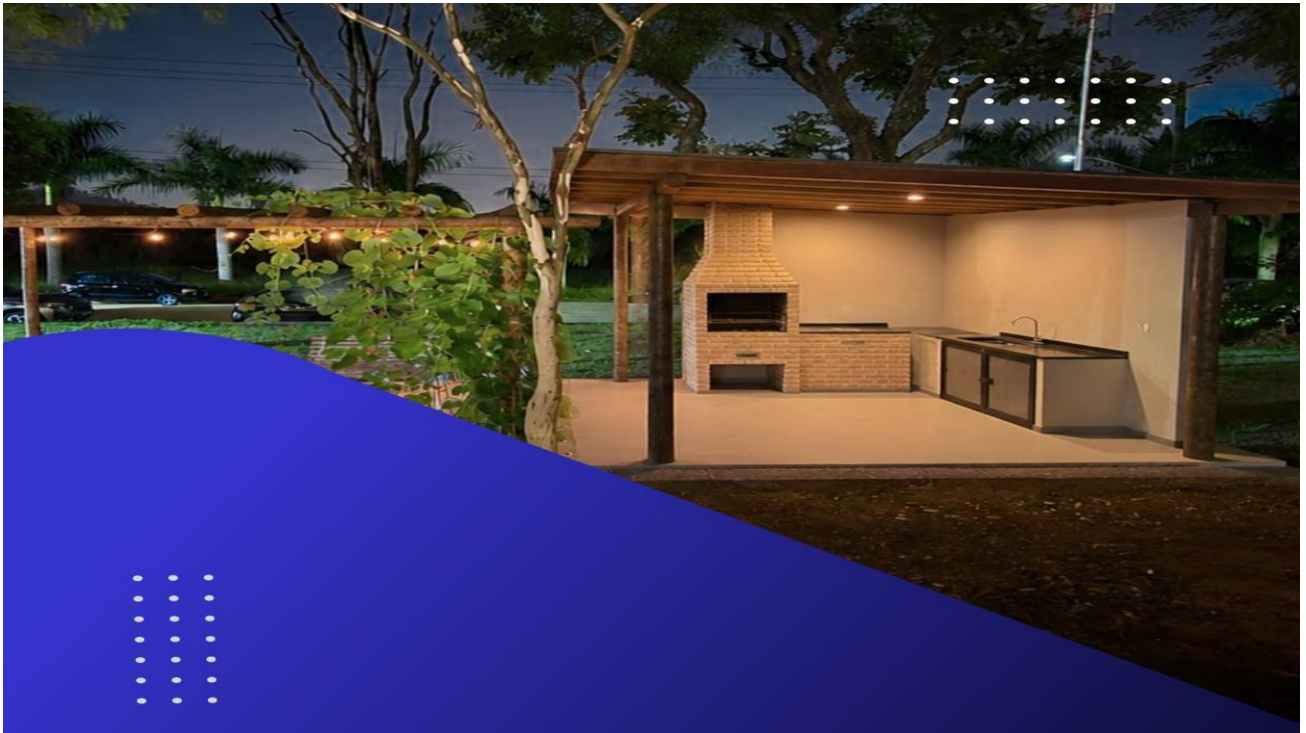

EVOLUÇÃO DA OBRA

2º MÊS

2º Mês de Evolução da Obra. Setembro de 2026.

Esta parte do relatório engloba todos os registros diários do segundo mês de obra.

DIÁRIO DE OBRA - RELATÓRIO DE TCC

INFORMAÇÕES GERAIS

Dia do Cronograma:	Dia 9
Data:	02/09/2026
Condições Climáticas:	Noite : Tempo com variação de nebulosidade e possibilidade de chuvas fracas por conta da instabilidade residual decorrente de sistema meteorológicos do dia anterior.
Temperatura Média:	Entre 10° C a 14° C
Responsável Técnico:	Profª Risoneide (orientadora)
Responsável Técnico no Canteiro de Obra:	Alunos: Thiago Matheus / Walmir / Lucas
Mão de Obra presente:	Alunos: Ana, Andressa, Cesar, Emerson, Hadassa, Ivaneide, Jacira, Jenifer, Laura, Lucas, Nathan, Pedrito, Sonia e Thiago Matheus, Thiago Nicolas e Walmir.
Responsável Técnico deste Relatório / Fotos	Aluna: Ana (relatorio/fotos/videos) Aluna: Hadassa, Jenifer, Laura e Sonia (fotos/videos)

MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Efetivo / Função	Equipamentos / Ferramentas
Pedreiro: Lucas, Thiago Matheus e Sonia, responsáveis pelo assentamento dos Blocos 14x29x39.	Conher de Pedreiro, Linha, Maseira, nível, Prumo.
Pedreiros/Ajudantes: Pedrito, Walmir, Jenifer, Nathan, Cesar, Emerson e Ivaneide	Maseira, Pá , Enxada, etc
Ajudantes Geral:Todos os presentes no dia	Transportando Blocos e insumos para argamassa. Executando tarefas em revesamento das ferramentas.
Equipamentos utilizado conforme controle do almoxarifado, aluna responsável Hadassa. (foto anexa)	Enxada, Pá, Lata, Colher de pedreiro, Picareta, Maseira, Prumo, Nivel de bolha, Linha de Nylon, Meia Cana, Vassoura, Martelo, Peneira e Carrinho de mão,

DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS

Devido as fortes chuvas de ontem 01/09/2026, os trabalhos foram retomados na data de hoje em regime de horário dobrado.

Atividades estão sendo desenvolvida em período noturno, sob iluminação artificial focada, com organização prévia do estoque de blocos cerâmicos e maseira ao longo do perímetro da parede para otimização do fluxo de trabalho.

As primeiras tarefas, foram realizar a movimentação e o suprimento de insumos do galpão central até o canteiro de obra, para garantir que cheguem e estejam disponíveis no canteiro de obra no momento exato para a utilização, o mesmo aconteceu com as ferramentas que vieram do almoxarifado. A logística ocorreu por meio de transporte manual complementar e horizontal via carrinhos de mão, trazendo areia, cimento e os blocos cerâmicos. O fluxo seguiu o plano de organização do canteiro para garantir o abastecimento continuo do ciclo produtivo da equipe de pedreiros.

Dado prosseguimento ao levantamento e assentamento das fiadas de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos, esses trabalhos seguiram os parâmetros da NBR 8545, abrangendo:

Alinhamento e Prumo: Verificação contínua do alinhamento horizontal com linha de pedreiro tensionada e controle de verticalidade por prumo de face.

Aplicação da argamassa feita no próprio canteiro de obra para assentamento com colher de pedreiro com espessura uniforme das juntas horizontais e verticais em torno de 10 mm a 15 mm, garantindo o correto travamento e amarração dos blocos (junta de amarração). Essa argamassa é dosada em volume na proporção recomendada pelo projeto e em estrita conformidade com a ABNT NBR 7200 (Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento), garantindo que o revestimento fique firme e dure por muito tempo.

Na etapa de execução, os alunos Pedrito e Walmir prepararam a argamassa com a seguinte quantidade:

1º Traço:

- 3 latas de areia média lavada peneirada,
- $\frac{1}{2}$ lata de cal hidratada,
- $\frac{3}{4}$ de lata de cimento tipo CPII,
- 10 litros de água que foi sendo adicionada aos poucos até atingir a consistência pastosa e homogênea (trabalhável).

2º Traço:

- 5 latas de areia média lavada peneirada,
- 1 lata de cal hidratada,
- 1 de lata de cimento tipo CPII,
- 1 Lata (18 litros) de água que foi sendo adicionada aos poucos até atingir a consistência pastosa e homogênea (trabalhável).

3º Foi feito o Graute (Microconcreto)

- 2 $\frac{1}{2}$ latas de areia média lavada peneirada,
- 2 latas de pedra britada,
- $\frac{1}{2}$ Saco de cimento tipo CPII,
- 1 e $\frac{1}{2}$ Lata de água.

Respeitando assim, os requisitos de aderência, consistência e retenção de água para a argamassa de assentamento misturada em canteiro que preconiza a ABNT NBR 13281, essa norma estabelece os requisitos, critérios e métodos de ensaio para argamassas inorgânicas utilizadas na Construção Civil.

Concomitantemente ao assentamento dos Blocos foram realizados outros serviços, no canteiro de obra e fora dele.

Um dos serviços realizados pelas alunas Andressa e Laura, que são responsáveis pelo desenvolvimento e detalhamento técnico da planta baixa arquitetônica e do projeto de instalações elétrica e hidrossanitária, foi feito na parte interna do estabelecimento de ensino mais precisamente na sala de informática onde as atividades são executadas em ambiente digital, utilizando a plataforma AutoCAD.

Enquanto isso, no Canteiro de Obra, os alunos, Emerson, Ivaneide, Hadassa, Pedrito, executavam a abertura de vala a céu aberto através de escavação manual para a implantação da tubulação da rede coletora de esgoto sanitário, conforme cotas do projeto hidráulico.

Foi realizada a verificação da inclinação/caimento nominal da vala para garantia do escoamento por gravidade e preparado a regularização do fundo da vala com camada de fundo de vala (colchão de areia) para assentamento e nivelamento das tubulações em PVC rígido.

Essa estratégia de gerenciamento garantiu o cumprimento das metas estipuladas para o período, neutralizando o potencial atraso gerado pela intempérie.

Todos os insumos excedentes, ferramentas e maquinário foram devidamente recolhidos para o almoxarifado técnico de acordo com os critérios de organização especial previsto pela ABNT NBR 12284. Ficando assim o canteiro de obra dentro dos requisitos de ordem e segurança previstos no item 18.12 da R 18 do Ministério do Trabalho.

OCORRÊNCIAS, DESVIOS OU ATRASOS

Devido as fortes precipitações pluviométricas registradas ontem 01/09/2026, que inviabilizou as atividades programadas e visando a recuperação do cronograma físico e a compensação da produção interrompida, os trabalhos foram retomados na data de hoje em regime de horário dobrado.

Essa estratégia de gerenciamento garantiu o cumprimento das metas estipuladas para o período, neutralizando o potencial atraso gerado pela intempérie.

No dia de hoje, além da retomada das obras, o local recebeu visita técnica e acompanhamento da etapa de logística de insumos, onde alunos do 2º semestre do curso Técnico em Edificações (ETECVAV), acompanhados pela **Professora Risoneide Araujo Sousa**, realizaram uma inspeção visual no canteiro de obra, com o objetivo de observar o andamento, os métodos construtivos e as práticas de execução aplicadas pelo grupo de formandos do 3º semestre, no qual estão desenvolvendo a construção do espaço para churrasqueira na instituição.

Hoje também recebemos com muita honra, a visita institucional de alinhamento e validação de projeto pedagógico/prático, o **Diretor da instituição ETEC Vasco Antonio Venchiarutti (ETECVAV), o Sr. Cristiano Augusto de Oliveira.**

A visita teve como objetivo inspecionar o progresso dos trabalhos e enaltecer o desempenho do grupo do alunos do 3º semestre do curso Técnico em Edificações, responsáveis pela execução física do projeto arquitetônico e estrutural do espaço para churrasqueira, que está sendo desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

No mais, tudo saiu conforme planejado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO (RELAÇÃO E LEGENDAS)

Código da Foto nº 66	Foto nº 67	Legenda Descritiva Técnica
		Foto nº 66 Carregamento manual de blocos cerâmicos de vedação para o canteiro de obra feito pelos alunos: Ana, Hadassa, Nathan e Cesar. Foto nº 67 Logística de movimentação horizontal de insumos através das dependências internas da instituição. Utilização de carro plataforma manual para o deslocamento seguro e ergonômico dos blocos cerâmicos até a frente de trabalho.

Código da Foto nº 68



Foto nº 69



Foto nº 68 Registra a visita dos alunos do 2º semestre do curso Técnico em Edificações (ETECVAV), acompanhados pela **Professora Risoneide Araujo Sousa**, onde realizaram uma inspeção visual no canteiro de obra, com o objetivo de observar o andamento, os métodos construtivos e as práticas de execução aplicadas pelo nosso grupo de formandos do 3º semestre, que estão desenvolvendo a construção do espaço para churrasqueira na instituição.

Foto nº 69 O grupo dos alunos: Ana, Hadassa, Ivaneide, Nathan e Cesar, fazendo a movimentação dos insumos (Blocos Cerâmicos 14x29x39).

Código da Foto nº 70



Foto nº 71



Legenda Descritiva Técnica

À esquerda foto nº 70 e nº 71, temos o registro do recebimento e descarregamento de forma manual dos blocos cerâmicos de vedação no canteiro de obras feitos pelos alunos Jenifer, Hadassa e Nathan.

Código da Foto nº 72




Foto nº 73



Legenda Descritiva Técnica

A foto nº 72 temos o registro da Conferência de recebimento de materiais feito pela Jenifer e Hadassa:
Processo de verificação física e quantitativa dos blocos cerâmicos

Na foto Nº 73 temos o registro da Logística de canteiro com transporte manual de agregados feito por Nathan e Cesar, até a frente de trabalho, garantindo a continuidade do ciclo produtivo da equipe de pedreiros.

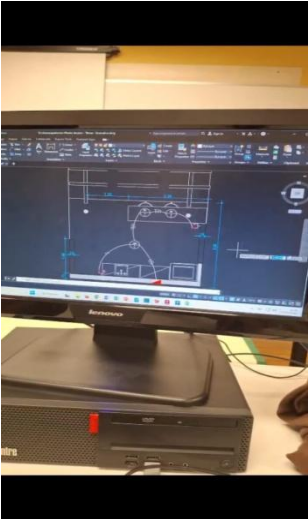Código da Foto nº 74	Foto nº 75	Legenda Descritiva Tecnica
		À esquerda a foto nº 74 temos o registro da aluna Sonia fazendo o remanejamento da areia com o auxilio de pá e carrinho de mão. Na foto da direita nº 75 a aluna Hadassa esta enchendo com auxilio de uma pá, a lata de areia que será utilizada na argamassa de assentamento dos blocos cerâmicos.
Código da Foto nº 76		Legenda Descritiva Tecnica
		À esquerda na foto nº 76 temos a mesma aluna Hadassa que encheu a lata de areia, só que agora esta peneirando a mesma areia com a ajuda do aluno Thiago Nicolas.
Código da Foto nº 77	Foto nº 78	Legenda Descritiva Tecnica
		Na foto nº 77 ao lado temos o registro fotográfico das alunas projetistas, Andrea e Laura responsáveis pelo desenvolvimento e detalhamento técnico da planta baixa arquitetônica e do projeto de instalações elétrica e hidrossanitária. Na foto nº 78 podemos verificar que as atividades estão sendo executadas em ambiente digital, utilizando a plataforma AutoCAD.

Código da Foto nº 79 	Legenda Descritiva Técnica À esquerda na foto nº 79, temos o registro detalhando a organização do canteiro de obras, com disposição de blocos cerâmicos próximos à frente de trabalho, para otimização do fluxo de assentamento. Equipe técnica atuando no levantamento das paredes periféricas, garantindo o prumo e alinhamento conforme projeto arquitetônico do ambiente.
Código da Foto nº 80 	Legenda Descritiva Técnica A imagem de nº 80, ilustra o andamento dos serviços de assentamento de blocos cerâmicos, para a delimitação do espaço para a churrasqueira no ambiente escolar. Nota-se a correta distribuição espacial dos materiais (tijolos e argamassa de assentamento) para facilitar a ergonomia e produtividade dos profissionais.
Código da Foto nº 81 	Legenda Descritiva Técnica A foto nº 81, registra o levantamento das paredes em alvenaria convencional para a futura área de convivência e churrasqueira. O registro fotográfico evidencia o canteiro organizado, o estoque de blocos cerâmicos posicionado estrategicamente e a equipe técnica realizando o assentamento e a paginação dos blocos de vedação no perímetro determinado.

Código da Foto nº 82 	Legenda Descritiva Técnica À esquerda na foto nº 82 temos o registro dos preparativos para elevação de paredes em blocos com a argamassa. Essa argamassa é dosada em volume na proporção recomendada pelo projeto e em estrita conformidade com a ABNT NBR 7200 (Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento), garantindo que o revestimento fique firme e dure por muito tempo.
Código da Foto nº 83  Foto nº 84 	Legenda Descritiva Técnica À esquerda na foto nº 83 temos o registro da aplicação da argamassa feita no próprio canteiro de obra para assentamento com colher de pedreiro sendo realizada pela aluna Sonia, com espessura uniforme das juntas horizontais e verticais em torno de 10 mm a 15 mm, garantindo o correto travamento e amarração dos blocos (junta de amarração).
Código da Foto nº 85  Foto nº 86 	Legenda Descritiva Técnica À esquerda na foto nº 85 observa-se o aluno Lucas realizando a aplicação da argamassa de assentamento com o auxílio de uma desempenadeira específica para esse serviço, no qual a argamassa é colocada sobre a fiada inferior, garantindo a espessura e a homogeneidade necessárias para a junta horizontal. Ja na foto nº 86 temos os alunos Thiago Matheus e ao fundo o aluno Lucas garantindo a espessura e a homogeneidade necessárias para a junta horizontal e o ajuste posicional dos blocos e o preenchimento das juntas verticais.

Código da Foto nº 87	Foto nº 88	Legenda Descritiva Técnica
		As imagens da foto nº 87, ilustram a etapa de execução e assentamento de alvenaria de vedação utilizando blocos cerâmicos vazados. No registro à direita (Foto nº 88), evidencia-se o processo de alinhamento, prumo e nivelamento das fiadas, onde os profissionais realizam o ajuste posicional dos blocos e o preenchimento das juntas verticais.
Código da Foto nº 89	Foto nº 90	Legenda Descritiva Técnica
		Na Foto nº 89 a aluna Ana Cristina esta realizando o procedimento de prumagem das fiadas. A utilização do prumo de face nesta etapa é indispensável para mitigar desvios de excentricidade e garantir que a parede seja erguida rigorosamente a 90° em relação ao plano horizontal (nível), prevenindo patologias estruturais e deformações excessivas. Na Foto nº 90 a aluna aplica na prática os conceitos de assentamento de componentes cerâmicos utilizando argamassa de ligação, durante a fase de elevação das paredes da área de convivência e churrasqueira na Etec Vasco Antonio Venchiarutti (ETECVAV).
Código da Foto nº 91	Foto nº 92	Legenda Descritiva Técnica
		As imagens da foto nº 91 ilustra a etapa de escavação manual de vala, na qual os alunos, Ivaneide e Emerson, estão escavando o solo para a implantação de rede coletora de esgoto secundário. O alinhamento e a profundidade da abertura foram dimensionados para garantir a declividade necessária ao escoamento gravimétrico das águas residuárias originadas na pia da área de lazer (churrasqueira). Na Foto nº 92, observa-se a utilização de ferramentas manuais de corte e percussão (enxadas e pás) para a remoção e regularização do subleito, preparando a seção transversal para o posterior assentamento da tubulação de PVC e posterior reaterro compactado.

Código da Foto nº 93 	Legenda Descritiva Tecnica Recebimento da visita institucional de alinhamento e validação do nosso projeto pedagógico/prático, o Diretor da instituição ETEC Vasco Antonio Venchiarutti (ETECVAV), o <u>Sr. Cristiano Augusto de Oliveira.</u>
Código da Foto nº 94 	Legenda Descritiva Tecnica Temos na foto nº 94 a evolução da obra no dia de hoje, onde a equipe apresentou um salto expressivo na taxa de produtividade em relação ao dia anterior de atividade nesta obra.
Código da Foto nº 95 	Legenda Descritiva Tecnica À esquerda na foto nº 95 que foi a evolução realizada no 8º dia de obra, foi colocada neste relatório para que possamos observar a evolução da obra e a clara maturidade operacional da equipe em termos de limpeza, organização e paginação dos blocos, que mesmo acelerando o cronograma, não comprometeu o padrão de qualidade.

Código da Foto nº 96	Legenda Descritiva Tecnica
	À esquerda a foto nº 96 temos o registro da evolução da parede de blocos cerâmicos em fase mais avançada do que a foto de nº 97. Sendo que esta etapa foi findada na data de hoje e a foto de nº 97 demonstra a mesma parede no fim das atividades do 8º dia de obra.

Código da Foto nº 97	Legenda Descritiva Tecnica
	À esquerda na foto nº 97, demonstra as atividades em evolução. E esta sendo apresentada neste relatório a título comparativo, para descrever o aumento da produtividade e qualidade da equipe de trabalho.

Código da Foto nº 98

Escola Técnica Vasco Antonio Venchiarutti Laboratório de Construção Civil										
Turma: 3 ^o L		Professores Resp.: Marcos		Alunos Resp.: Hadassa		Data: 02/09/2020				
Quantidade:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Material:	Devolução:
X									Chave.	OK
	X								Arfeteiro.	OK
	X								Pra.	OK
	X								Furadeira.	OK
	X								Marreta.	OK
X									Modulo.	OK
X									Cavalo.	OK
X									Vassoura.	OK
X									Talho.	OK
	X								Arfeteiro.	OK
X									Masseira.	OK
X									Bacaxeta.	OK
X									Martelo.	OK
X									Unha.	OK
Houve quebra ou perda de alguma ferramenta? Quais?										

Legenda Descritiva Tecnica

Na foto ao lado , temos o controle do Almojarifado , na qual a aluna Hadassa esta se responsabilizando em fazer o registro de retirada / devolução de todos os equipamentos e ferramentas de uso coletivo usado no dia de hoje para a execução da obra, onde todos os “OK” significa que todo o material retornou 100% intacto.

ALUNOS DO TCC e suas Responsabilidades.

Ana Cristina Fernandes Pereira

Responsável Redatora e Formatadora TCC
Responsável Relatório Diário de Obra
Responsável Registros (Fotos e Mídias)
Responsável Banners e objetos de Divulgações
Responsável Técnico pelo paisagismo do entorno

Andressa dos Santos Rodrigues

Responsável Desenho Técnico Plantas Baixa e cortes
Responsável Projeto Arquitetônico e modelagem BIM/CAD

Cesar Daniel Martins

Responsável Técnico Pintura e Acabamento

Emerson Luis Gonçalves

Responsável Técnico Pintura e Acabamento

Hadassa Francini Ferreira da Silva

Responsável Técnico do Cronograma
Responsável Banners e objetos de Divulgações
Responsável Registros (Fotos e Mídias)

Ivaneide Pereira Sobreira

Responsável Técnico Planilha de Cotação
Responsável Almoxarifado

Jacira Szoke

Responsável Quantitativo / Orçamento
Responsável Relatório da CPU
Responsável Mapa de Cotação

Jenifer Abigail Ferreira da Silva

Responsável Técnico de Segurança do Trabalho
Responsável Banners e objetos de Divulgações
Responsável Registros (Fotos e Mídias)

Laura Barreto da Silva Reis

Responsável Projeto Complementar Hidráulica
Responsável Projeto Complementar Elétrica

Lucas Costa Britto

Responsável Logística / Liderança do Projeto
Responsável Técnico da Alvenaria
Responsável Técnico Hidráulica
Responsável Técnico pela Construção da Churrasqueira

Nathan Fabio Rodrigues

Responsável Técnico Pintura e Acabamento

Pedrito de Jesus Santos

Responsável Técnico da Alvenaria
Responsável Técnico Elétrica

Sônia Ferreira de Oliveira

Responsável Técnico pelo paisagismo do entorno

Thiago Matheus Silva

Responsável Logística / Liderança do Projeto
Responsável Técnico da Alvenaria
Responsável Técnico Hidráulica
Responsável Técnico pela Construção da Churrasqueira

Thiago Nicolas Szoke

Responsável Quantitativo / Orçamento
Responsável Relatório da CPU
Responsável Mapa de Cotação

Walmir Cruz

Responsável Logística / Liderança do Projeto
Responsável Técnico da Alvenaria
Responsável Técnico Hidráulica
Responsável Almoxarifado

Todos os integrantes do Grupo são responsáveis em conjunto e em revezamento, nas seguintes Etapas:

Responsável pela preparação da organização final da Banca.

Responsável pela organização do evento de entrega do espaço Churrasqueira para a ETECVAV (Cerimonial de entrega).

Responsável pela limpeza após obra.

Responsável por ajudar em todos os detalhes durante a obra.
